

113學年專案管理 第 1 組

日本京阪七日遊 專案企劃書

指導老師：彭金山 助理教授

組長：彭怡萱 11014181

組員：文爰蓉11014016、陳芊妘11014034

林姿妙11014057、邱孟琪11014184

報告日期：中華民國114年01月06日



目錄

一、專案之需求

二、專案管理的目標

三、範疇及限制

四、利害關係人描述

五、工作分析結構

六、分工任務

七、網路圖及專案時程表(含寬裕時間表)

八、預估作業資源

九、風險評估

十、工作分配及參考資料



一、專案需求

**在畢業後與大學好友結伴到日本七日遊，在有限的預算下，
共同體驗日本文化，留下愉快的回憶。**



二、目標

在出發旅遊前完成行前規劃與準備，並取得全員共識。

在6/15～6/21期間擁有5人愉快的旅遊。

有規劃的在7天內有效率的抵達目的景點完成目標活動，旅遊過程安全安心。



三、範疇與限制

a 顧客需求

使用公共交通工具，住宿在交通方便的地區

良好的旅遊體驗（體驗日本文化與品嚐日本名產）

安全有效率的行程，符合預算每人40,000元以內

b 工作說明

訂機票、酒店、景點安排、交通路線、旅費計算

收集費用、投保作業、

行程確認（含路線規劃、備選路線規劃、風險回應計畫）

c 交付標的

行程同意書、機酒費用繳交、

收齊護照、行程規劃、保單收據

d 允收標準

全員の同意書、收齊費用

e 限制

單人預算最高4萬以內

持有護照並在期限內

旅遊日期2025/6/15 ~ 6/21

範圍在日本京都與大阪地區內



四、利害關係人

同行好夥伴

航空公司

旅館業者

餐廳業者

保險業者

運輸業者

參與者家屬

組員一起旅遊的夢想

前往日本的主要交通、成行的關鍵

提供組員安全住宿

提供組員美味的食物


確保有意外時能獲得賠償

讓組員抵達目的地的交通工具

緊急聯絡人



五、工作分解結構

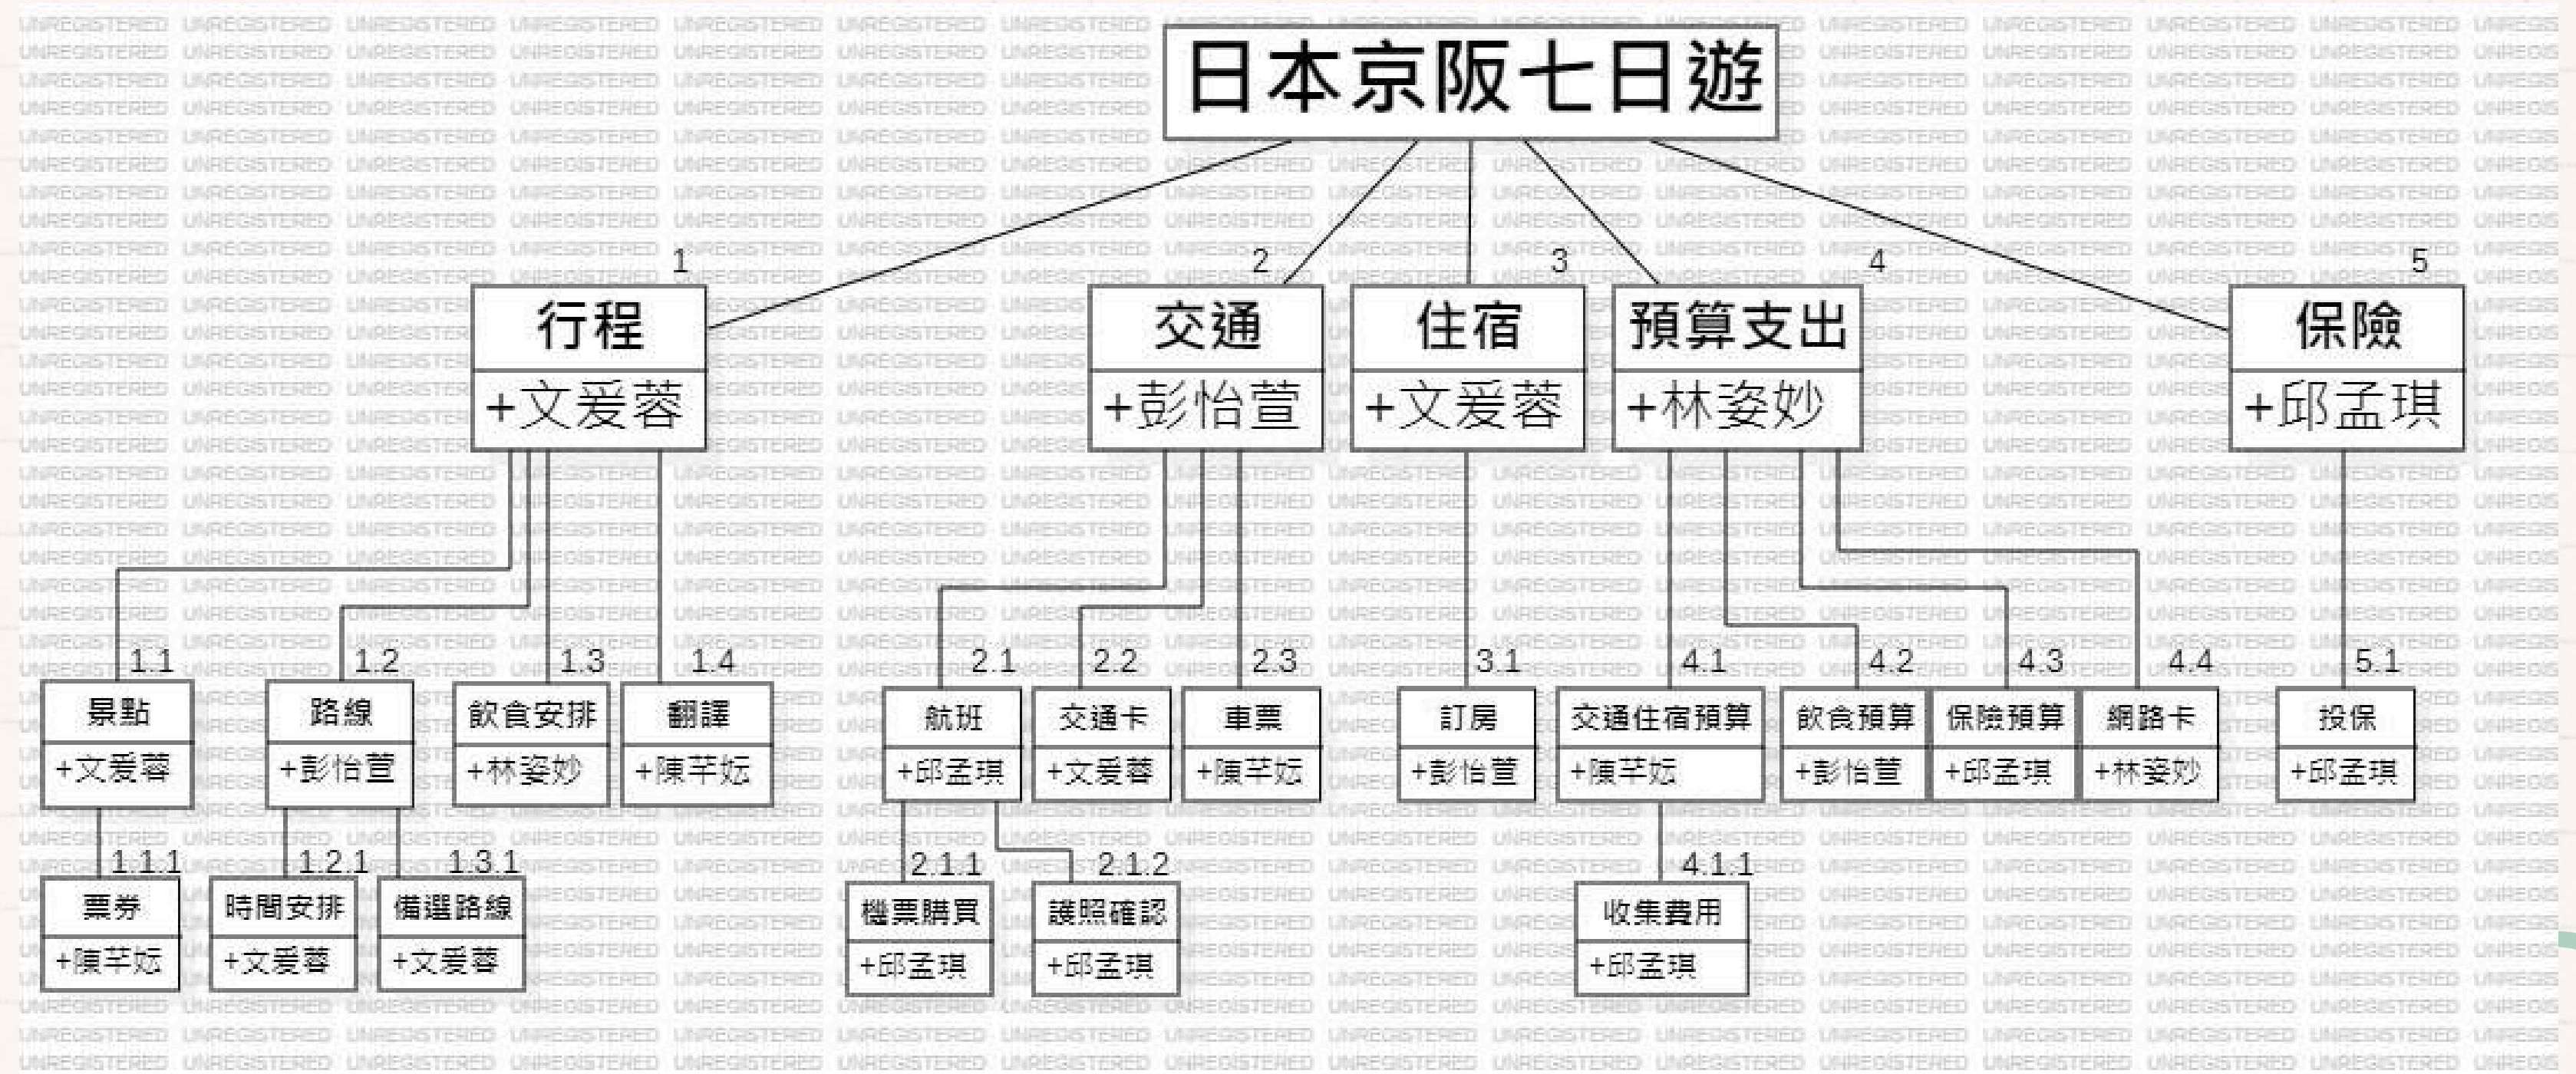

工作分析結構圖

工作分解結構		描述	負責人員	交付標的
	京阪七日遊			
1.0	行程		文爰蓉	行程同意書
1.1	景點	調查目的地可去景點及周邊	文爰蓉	景點調查文件
1.2	路線	確認景點開放時間及入場規範	彭怡萱	路線規劃書
1.3	飲食	搜尋景點與飯店附近的餐廳或小食攤位	林姿妙	
1.4	翻譯	需組員陳芊妘有到場	陳芊妘	由JLPT N1通過的陳芊妘負責
2.0	交通		彭怡萱	
2.1	航班	確認符合日程的航班班機	邱孟琪	訂票資料
2.2	交通卡	確認該交通卡適用當地交通體系	文爰蓉	確認卡種

工作分解結構		描述	負責人員	交付標的
2.3	車票	根據路線規劃購買需要的車票	陳芊妘	確認搭乘JR的卡
3.0	住宿		文爰蓉	安心住宿
3.1	訂房	•確認住宿之飯店處於交通便利地段•確認飯店符合組員需求•房型與床位分配•確認飯店其他附加服務（如洗衣機、衛浴等設施）	彭怡萱	訂單確認信
4.0	預算支出		陳芊妘	符合預算
4.1	交通住宿	•訂定機票預算•確定飯店符合預算	邱孟琪	收齊費用
4.2	飲食	•確認組員之飲食預算•確認行程規劃之餐廳消費符合預算	彭怡萱	
4.3	保險費	•確認投保保險之費用	邱孟琪	
4.4	網路卡	•確認組員網路卡需要的額度•確認網路卡費用	林姿妙	
5.0	保險	•取得組員投保用資料•投保旅行平安險、旅行不便險	邱孟琪	取得保單

應備文件表

層次	工作任務	應備文件或器具
1.0	行程	
	1.1 景點	景點調查文件
	1.1.1 票券	訂購成功確認信
	1.2 路線	路線規劃文件
	1.2.1 時間安排	時間表
	1.2.2 備選路線	備選路線規劃表
	1.3飲食	周邊餐廳表
	1.4翻譯	由隨行的陳芊妘負責

層次	工作任務	應備文件或器具
2.0	交通	
	2.1航班	航班資料
	2.1.1機票購買	機票、護照、基本資料
	2.1.2護照確認	護照
	2.2交通卡	交通卡
	2.3車票	車票

應備文件表


層次	工作任務	應備文件或器具
3.0	住宿	
	3.1訂房	飯店確認email
4.0	預算支出	
	4.1交通住宿	錢
	4.1.1收集費用	錢
	4.2飲食	周邊餐廳菜單
	4.3保險	保險說明、保單
	4.4網路卡	網路卡
5.0	保險	
	5.1投保	保單

責任指派矩陣


工作分解結構編號	工作項目	彭怡萱	陳芊妘	林姿妙	文爰蓉	邱孟琪
日本京阪七日遊		P	S	S	S	S
1.0	行程	S	S	S	P	S
1.1	景點		S		P	S
1.1.2	票券		P			
1.2	路線	P			S	
1.2.1	時間安排		S	S	P	
1.2.2	備選路線				P	
1.3	飲食安排	S	S	P	S	S
1.4	翻譯		P			
2.0	交通	P	S		S	S
2.1	航班					P
2.1.1	機票購買					P
2.1.2	護照確認					P

工作分解結構編號	工作項目	彭怡萱	陳芊妘	林姿妙	文爰蓉	邱孟琪
2.2	交通卡				P	
2.3	車票		P			
3.0	住宿	S			P	
3.1	訂房	P				
4.0	預算支出	S	S	P		S
4.1	交通住宿		P			S
4.1.1	收集費用					P
4.2	飲食預算	P				
4.3	保險費					P
4.4	網路卡			P		
5.0	保險					P
5.1	投保					P

七、網路圖及專案時程表(含寬裕時間表)

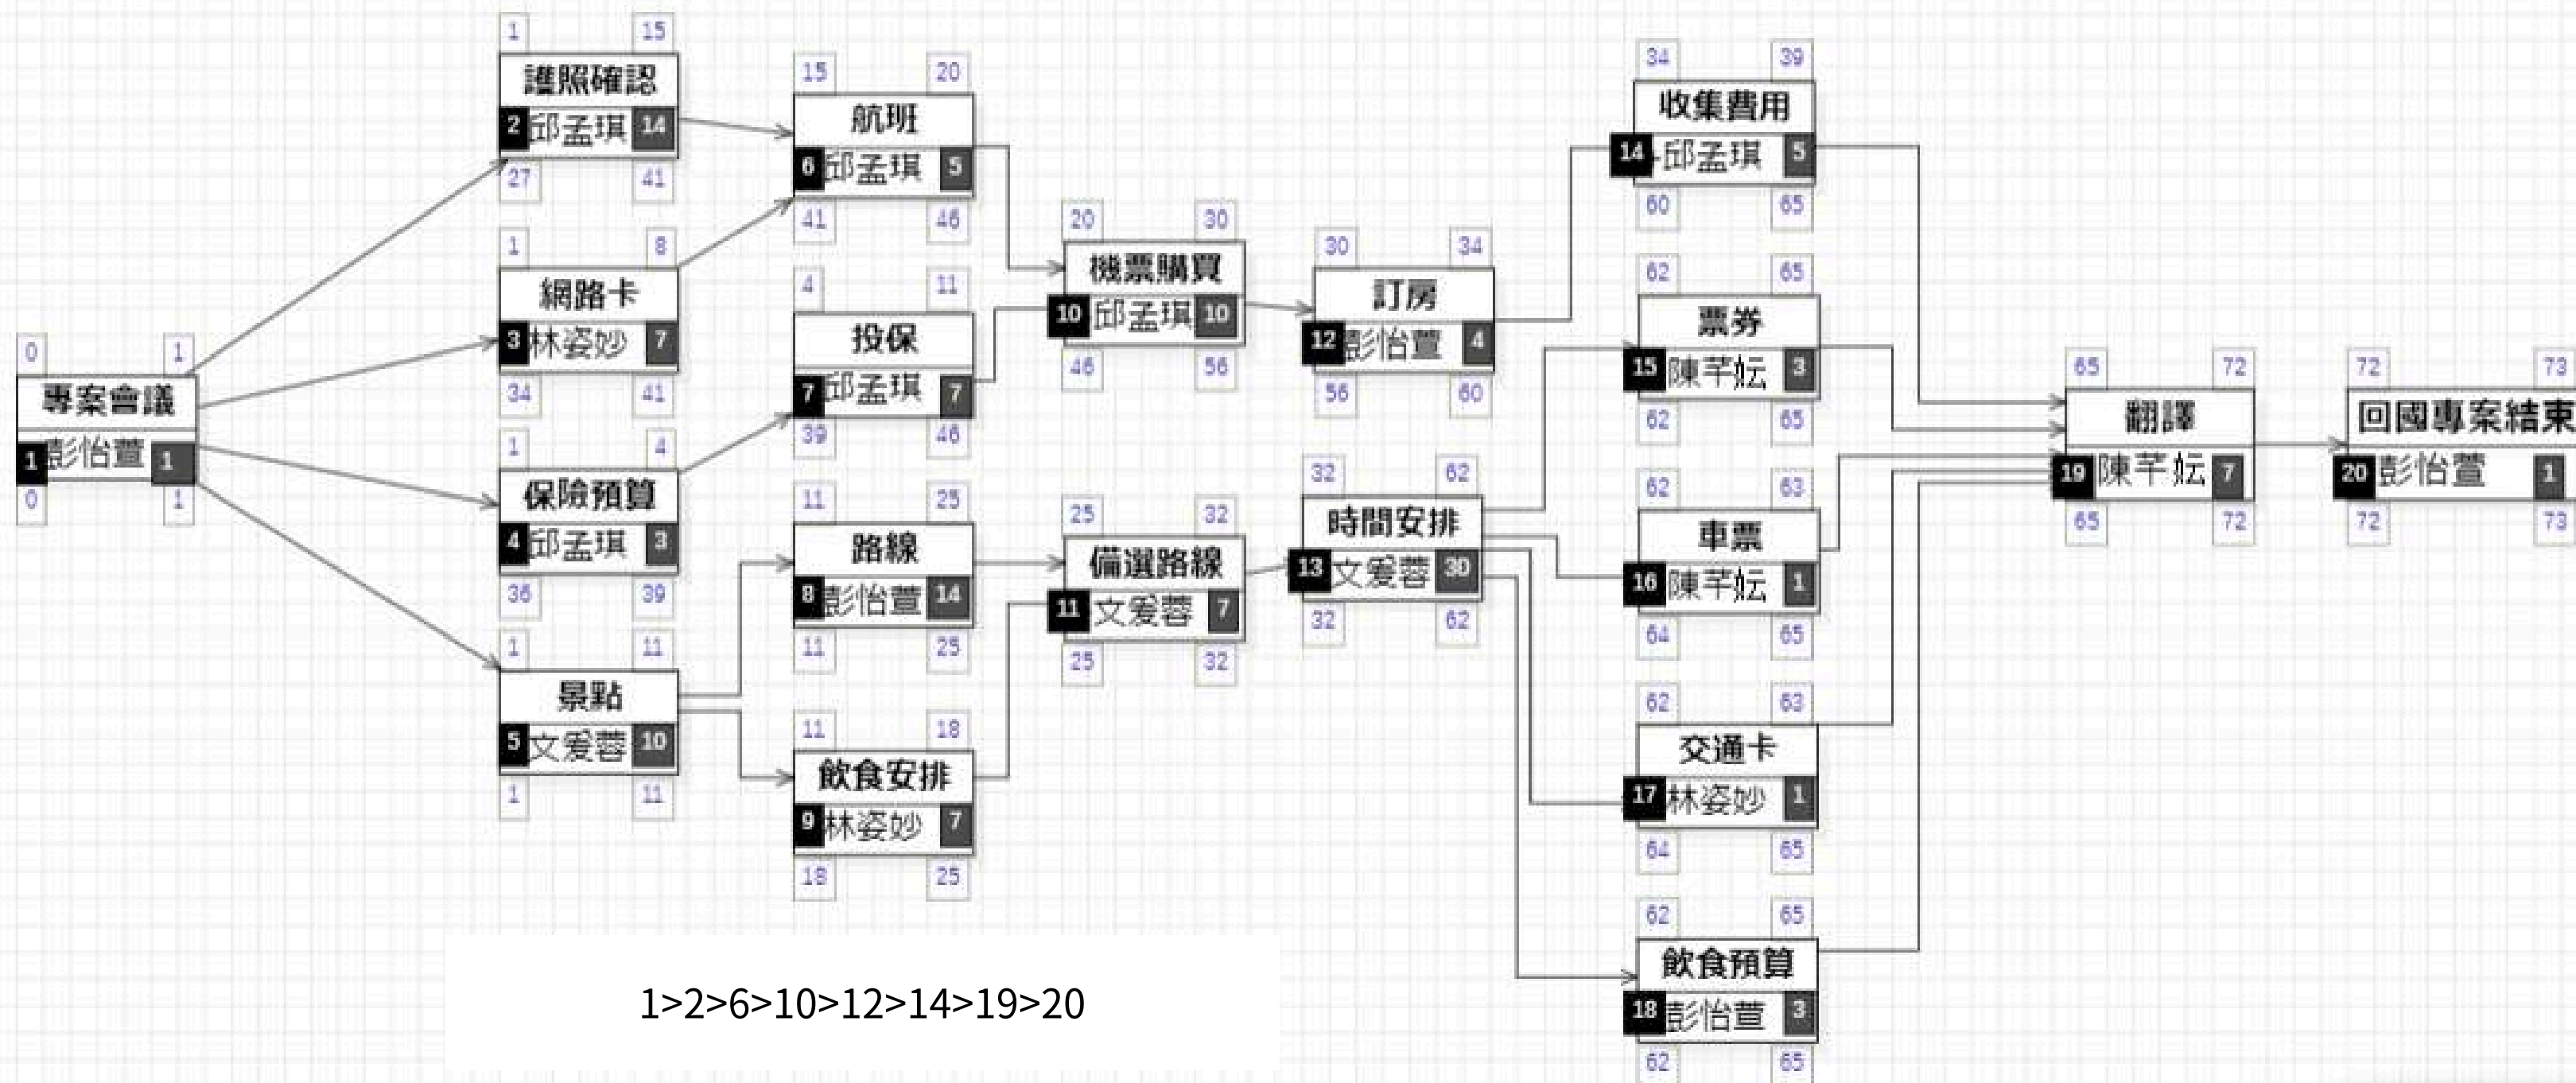

網路圖

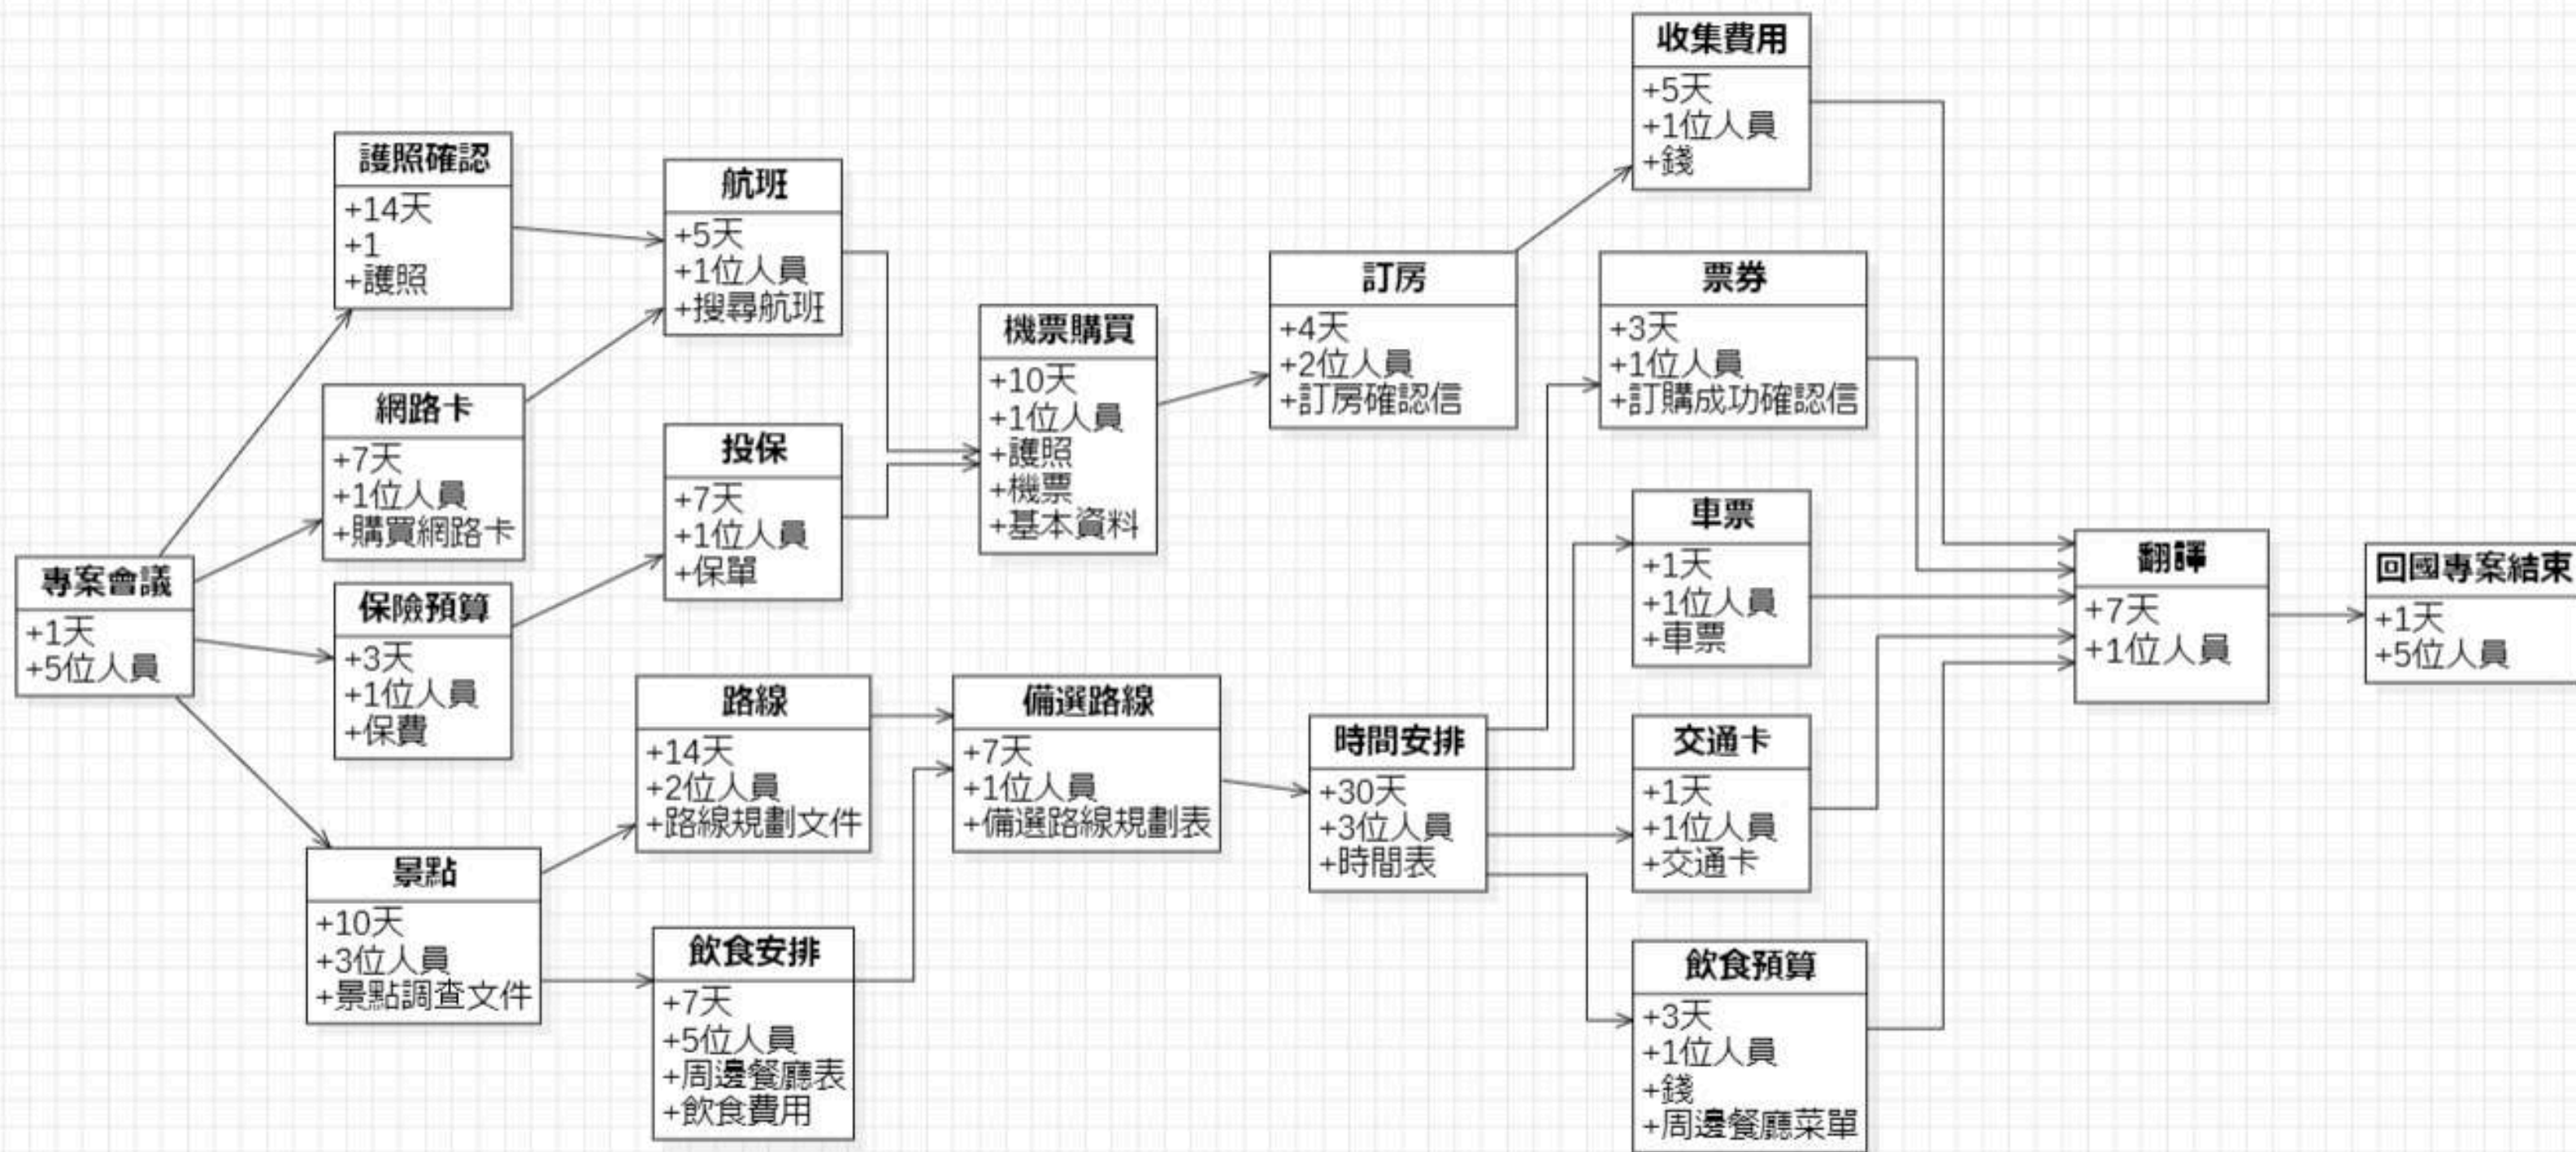


專案時程表(含寬裕時間表)

日本京阪七日遊			預估工期	最早時間		最晚時間		總寬裕時間
作業		負責人		開始	完成	開始	完成	
1	專案會議	彭怡萱	1	0	1	0	1	0
2	護照確認	邱孟琪	14	1	15	27	41	26
3	網路卡	林姿妙	7	1	8	34	41	33
4	保險預算	邱孟琪	3	1	4	36	39	35
5	景點	文爰蓉	10	1	11	1	11	0
6	航班	邱孟琪	5	15	20	41	46	26
7	投保	邱孟琪	7	4	11	39	46	35
8	路線	彭怡萱	14	11	25	11	25	0
9	飲食安排	林姿妙	7	11	18	18	25	7
10	機票購買	邱孟琪	10	20	30	46	56	26

日本京阪七日遊			預估工期	最早時間		最晚時間		總寬裕時間
作業		負責人		開始	完成	開始	完成	
11	備選路線	文爰蓉	7	25	32	25	32	0
12	訂房	彭怡萱	4	30	34	56	60	26
13	時間安排	文爰蓉	30	32	62	32	62	0
14	收集費用	邱孟琪	5	34	39	60	65	26
15	票券	陳芊妘	3	62	65	62	65	0
16	車票	陳芊妘	1	62	63	64	65	2
17	交通卡	林姿妙	1	62	63	64	65	2
18	飲食預算	彭怡萱	3	62	65	62	65	0
19	翻譯	陳芊妘	7	65	72	65	72	0
20	回國結束專案	彭怡萱	1	72	73	72	73	0

專案時程表(使用GanttProject製作)

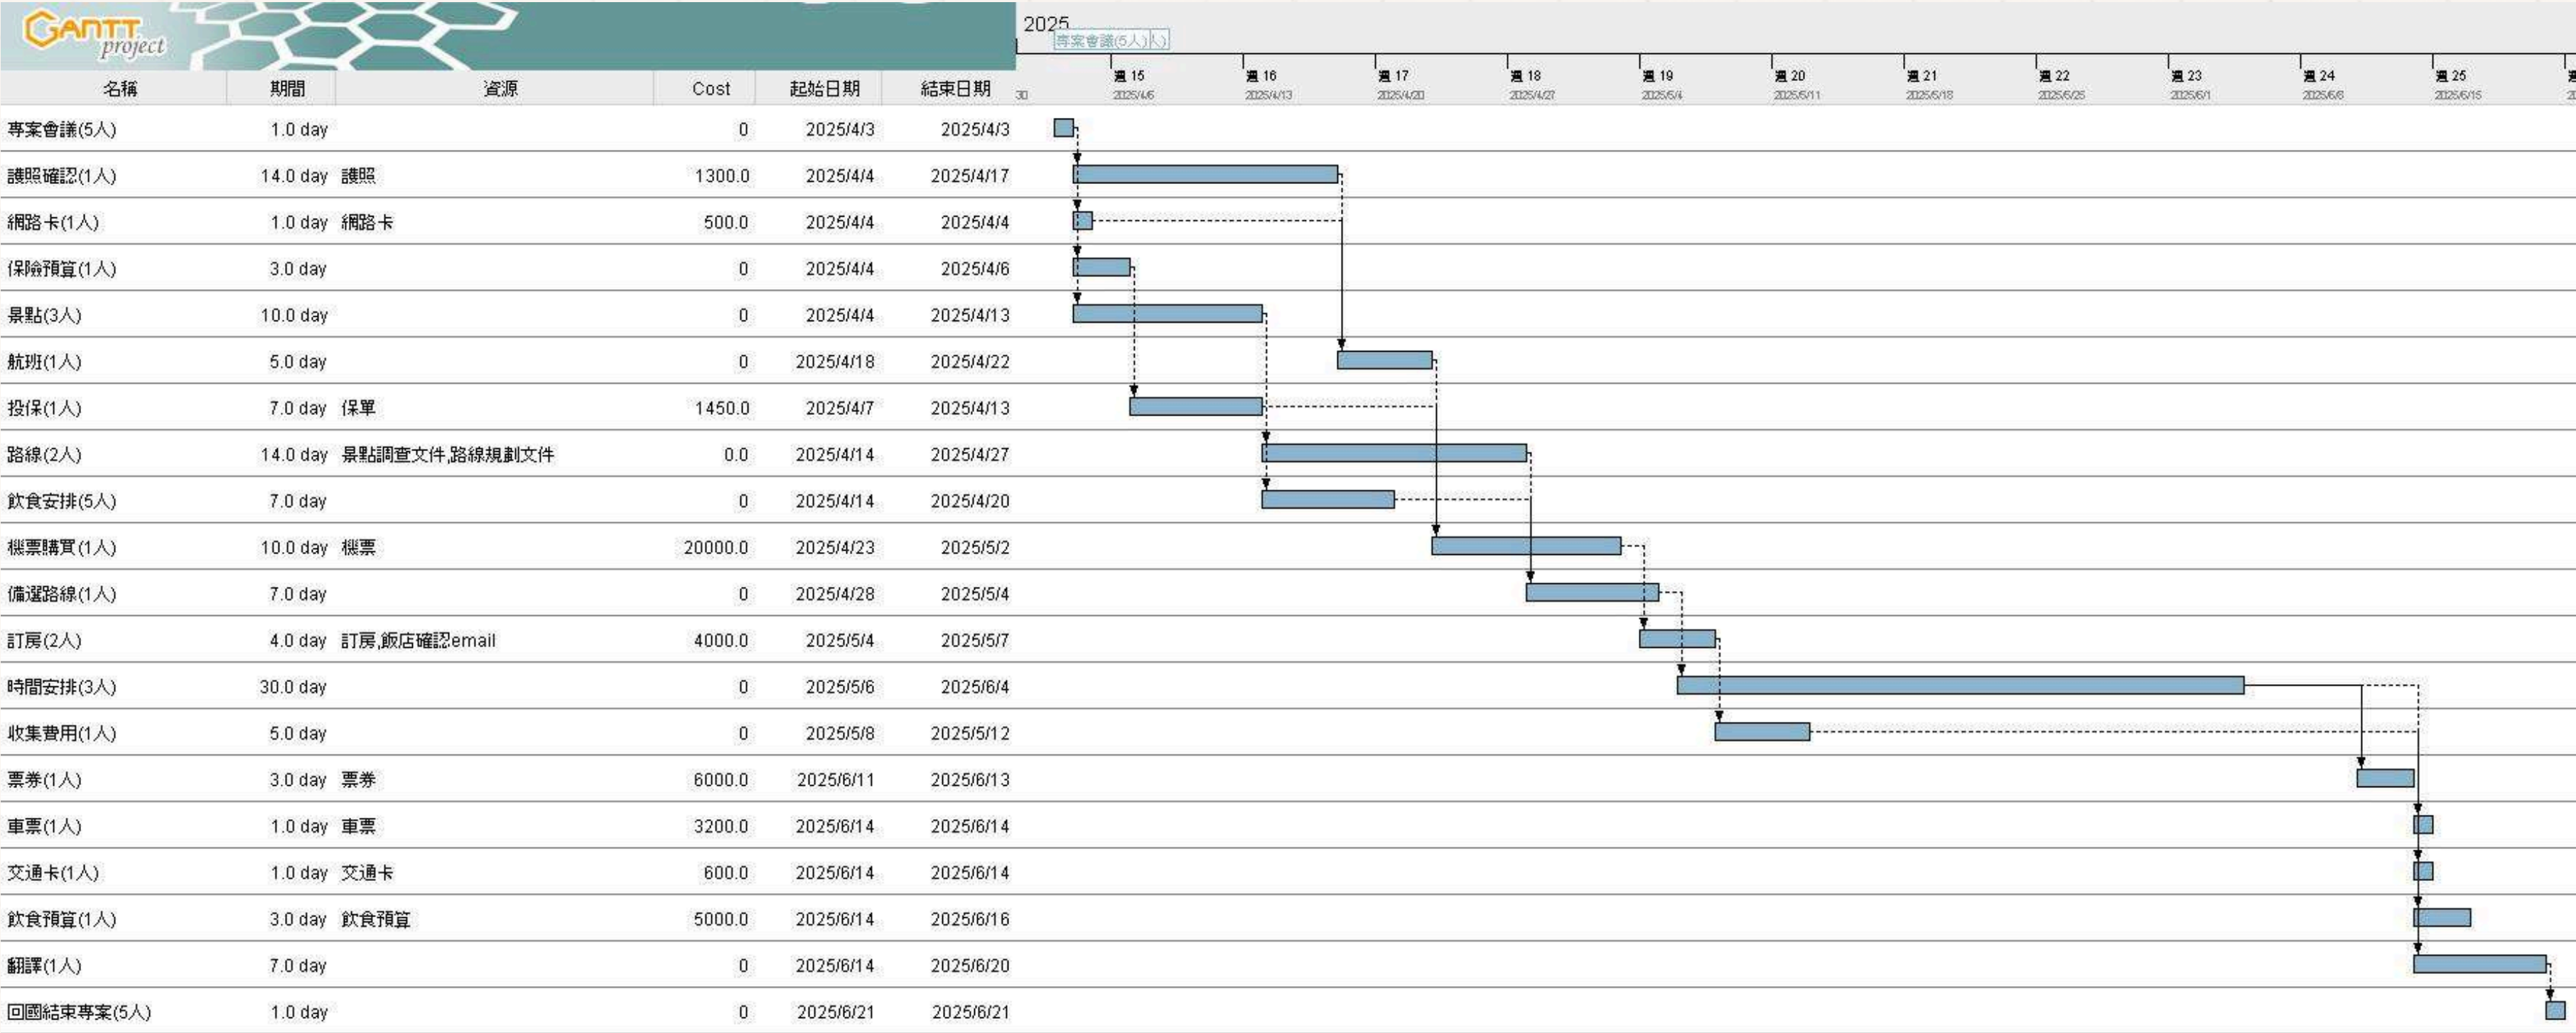

八、預估作業資源

預估作業成本 (每人)

日本京阪七日遊			預估工期	機旅成本	票券成本	飲食成本	交通成本	保險成本	通訊成本	總成本
作業		負責人								
1	專案會議	彭怡萱	1							
2	護照確認	邱孟琪	14	1,300						1,300
3	網路卡	林姿妙	7						500	500
4	保險預算	邱孟琪	3							
5	景點	文爰蓉	10							
6	航班	邱孟琪	5							
7	投保	邱孟琪	7					*1,450		1,450
8	路線	彭怡萱	14							
9	飲食安排	林姿妙	7							
10	機票購買	邱孟琪	10	20,000						20,000

*旅平險保額1,200萬元

日本京阪七日遊			預估工期	機旅成本	票券成本	飲食成本	交通成本	保險成本	通訊成本	總成本
作業		負責人								
11	備選路線	文爰蓉	7							
12	訂房	彭怡萱	4	4,000						4,000
13	時間安排	文爰蓉	30							
14	收集費用	邱孟琪	5							
15	票券	陳芊妘	3		2,000					2,000
16	車票	陳芊妘	1				3,200			3,200
17	交通卡	林姿妙	1				600			600
18	飲食預算	彭怡萱	3			5,000				5,000
19	翻譯	陳芊妘	7							
20	回國結束專案	彭怡萱	1							
	合計		73	25,300	2,000	5,000	3,800	1,450	500	38,050

總預算成本

		總預算 成本	週										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	專案會議												
2	護照確認	6,500	6,500										
3	網路卡	2,500	2,500										
4	保險預算												
5	景點												
6	航班												
7	投保	7,250	7,250										
8	路線												
9	飲食安排												
10	機票購買	100,000			100,000								

			週										
		總預算 成本	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	備選路線												
12	訂房	20,000					20,000						
13	時間安排												
14	收集費用												
15	票券	10,000										10,000	
16	車票	16,000										16,000	
17	交通卡	3,000										3,000	
18	飲食預算	25,000										25,000	
19	翻譯												
20	回國結束專案												
	合計	190,250	16,250		100,000		20,000					54,000	
	累積		16,250		116,250		136,250					190,250	

九、風險評估

風險	影響	發生可能性	影響等級	觸發動作	責任	回應計畫
護照忘記帶	無法搭乘航班	低	高	報到失敗	邱孟琪	出發前向全員確認護照
飛機延誤	活動時間減少 旅宿時間異動	低	高	航班狀態發生異動	邱孟琪	購買保險保障 申請班機延誤/取消證明進行 後續處理
行李遺失	財產損失	低	中	丟失當下	文爰蓉	在行李上做顯眼的辨識。 貴重物品隨身攜帶保管 向航空公司櫃檯尋求協助 找保險公司理賠
天氣問題	戶外行程可能需要 變更	中	低	戶外活動天氣不佳	文爰蓉	預先確認天氣預報 安排備選室內行程
水土不服	身體不適	中	高	不服當下	文爰蓉	吃藥休息

風險	影響	發生可能性	影響等級	觸發動作	責任	回應計畫
因故無法出發	個人損失訂金	低	高	出發當天	彭怡萱	機酒下訂后：不退費、 訂購前可退費
護照遺失	無法退稅與登機	低	高	發現護照不見	陳芊妘	保管好重要證件 求助駐日本代表處
景點未開放	行程被打亂	低	中	抵達景點	文爰蓉	行前再次先進行確認 啟動備選路線
人員失蹤	行程大亂SOS	低	高	人不見	彭怡萱	報警 告知緊急聯絡人 求助駐日本代表處
發生意外（重傷）	人員受傷 （專案失敗）	低	中	意外發生	彭怡萱	送醫 告知緊急聯絡人
房間有問題	沒辦法入住	低	高	不適合住	彭怡萱	交涉更換房間

十、工作分配及參考資料

項目	組長 彭怡萱	組員 文爰蓉	組員 陳芊妘	組員 林姿妙	組員 邱孟琪
組長	✓				
討論出席次數	13/12	12/12	13/12	11/12	8/12
文檔製作	✓	✓	✓	✓	✓
PPT製作	✓	✓	✓	✓	✓
project檔 / 製圖			✓		
企劃案背景資料 收集者	✓	✓	✓		✓
檔案整理	✓		✓		
上台簡報者	✓	✓	✓	✓	✓



參考資料

《專案管理》

ISBN : 9789865632311

旅館資訊

<https://reurl.cc/26QXdX>

機票價格

<https://reurl.cc/ZZlQKp>

當地車票價格

<https://www.westjr.co.jp/global/tc/timetable/>

景點

<https://tw.wamazing.com/media/article/a-1065/>

<https://reurl.cc/DKbgZE>

<https://daisycc.com/kansai-trip/>

旅遊保險

<https://reurl.cc/36bNG9>

環球影城門票購買

<https://reurl.cc/gen8gb>

電話卡購買

<https://reurl.cc/RL904e>

**Thank you
very much!**

